

**足場組立て後等の点検表**  
(次世代足場 Iq SYSTEM)


**KYC** 光洋樹林産業株式会社

点検実施日	年 月 日 ( ) AM/PM : ~ :		
元方事業者名			
工事名称			
検査工区			元請確認
施工協力会社		作業主任者(職長)	
点検会社			
点検者氏名			
点検理由	・組立て後 ・変更後 ・悪天候後 ・地震後 ・一部解体後 ・その他 ( )		

分類	点検項目	点検内容	判定	備考
基礎	基礎の状態	1 地盤面は安定した状態にあるか(目視による)	良 否	
	敷板、敷角	2 地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか	良 否	
基礎との固定状態	ジャッキベース類	3 ベースは敷板、敷角に正しく固定されているか	良 否	
		4 ジャッキベース類のレベルは正しいか	良 否	
支柱とジャッキベース	ジャッキベース	5 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか	良 否	
		6 ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか	良 否	
滑動防止	根がらみ	7 桁行方向に2スパン以上根がらみの無いスパンはないか	良 否	
		8 敷板にジャッキベースを釘止めしない場合:根がらみは直角2方向に取り付けられているか	良 否	
		9 敷板にジャッキベースを釘止めする場合:敷板と直角方向に根がらみが設けられているか	良 否	
		10 根がらみ用布材のくさびは正しく打ち込まれているか	良 否	
支柱の接続	抜け止め措置	11 支柱のロックピンが確実にロックされているか	良 否	
支柱の間隔	支柱	12 支柱の設置間隔は指定通りか	良 否	
作業床	床付き布わく	13 指定通りの幅の床付き布わくが設置されているか	良 否	
		14 つかみ金具の外れ止めはロックされているか	良 否	
		15 床材間の隙間は3cm以下か、床材と建地の隙間は12cm以下か	良 否	
布材、ブラケット等	設置状態	16 くさびは正しく打ち込まれているか	良 否	
		17 布材等の設置位置は指定通りか	良 否	
先行手すり	設置状態	18 設置位置は指定通りか	良 否	
		19 取付部のくさびの緩みはないか	良 否	
		20 先行手すりを使用していない場合、大筋かいが取り付けられているか	良 否	
躯体との固定	壁つなぎ	21 垂直水平方向とも指定通りの間隔で設置されているか	良 否	
		22 躯体側、足場側ともに堅固な位置に正しく固定されているか	良 否	
昇降設備	階段等	23 安全に昇降できる昇降設備は設けられているか	良 否	
		24 階段手すり及び階段開口部手すりは設置されているか	良 否	
		25 踊り場は2層以下毎に設置されているか	良 否	
開口部	梁枠等	26 梁枠を用いた開口の高さは3層以下か	良 否	
		27 梁枠の外方1スパンには最下層から梁枠のレベルまで各層に先行手すりが設置されているか	良 否	
		28 梁枠を支持する支柱から外方に1スパン以上設置されているか	良 否	
		29 梁枠の両端支持部の支柱に壁つなぎが設けられているか	良 否	
		30 梁枠間の水平面に床付き布わくを設け水平構を形成しているか	良 否	
安全設備等	転落・墜落防護工	31 転落・墜落のおそれのある場所に、手すりや安全ネット等が設置されているか	良 否	
外観検査	垂直方向	32 支柱は垂直に組み上がっているか	良 否	
	水平方向	33 通りや水平は正しく出ているか	良 否	
	不良部材	34 著しい変形や破損のある不良部材を使用していないか	良 否	
最終確認	組立図	35 部品の組み忘れはないか	良 否	
		36 組立図通りに部材の配置、取り付けが行われているか	良 否	

注意) この点検表は今後の安全を保障するものではありません。

Ver.20240318(E-技仮24-001-0)

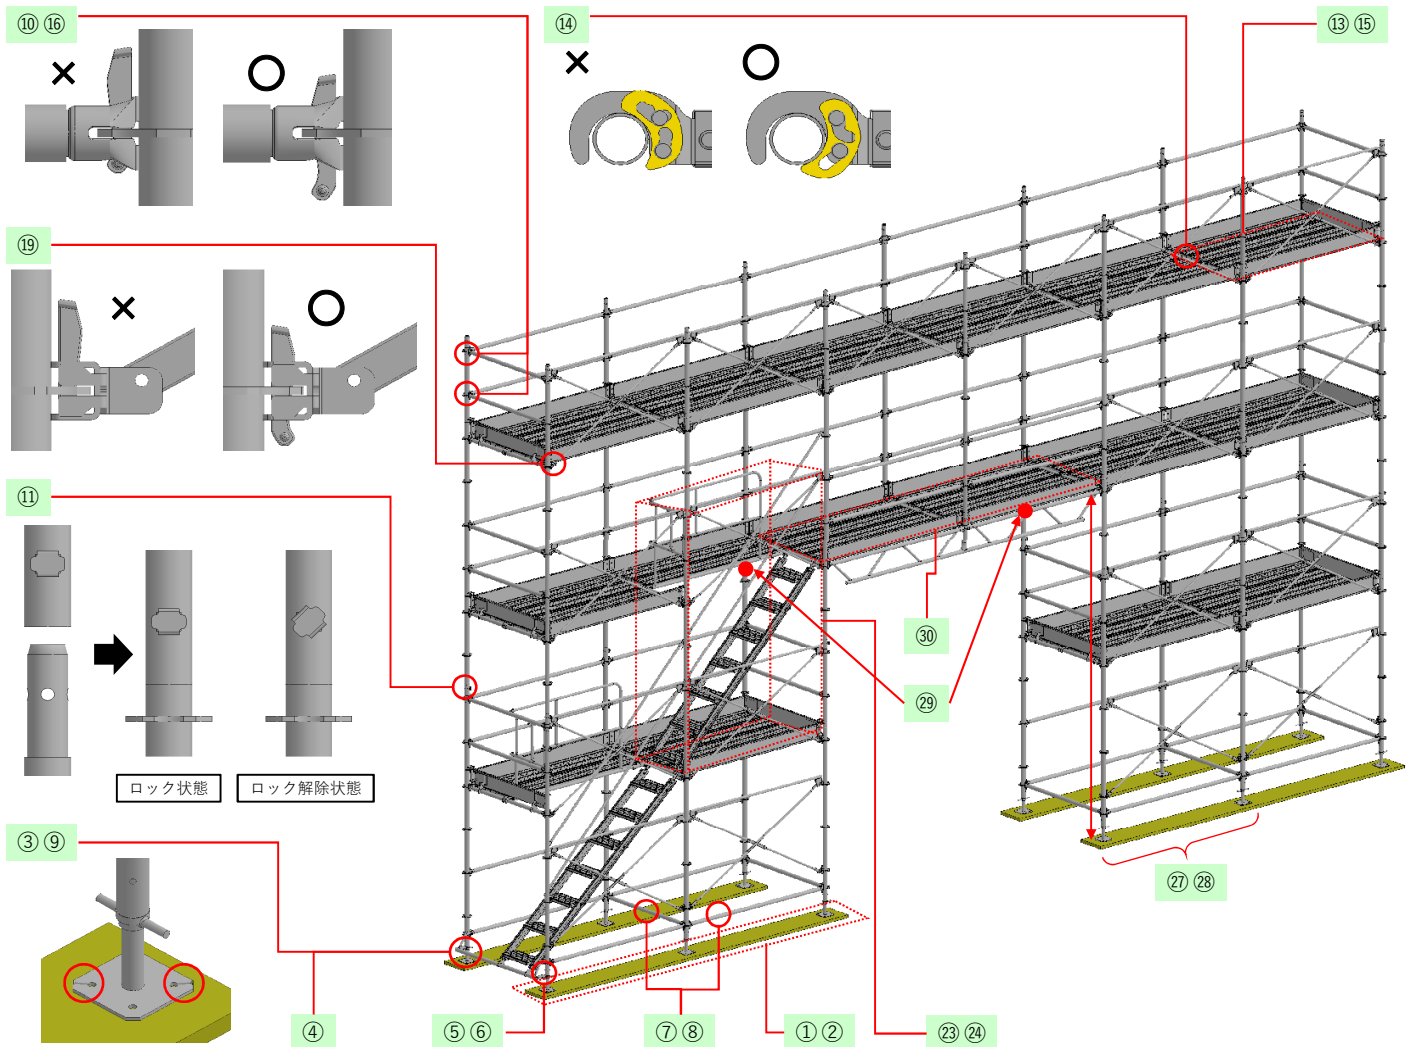

点検内容

- ① 地盤面は安定した状態にあるか(沈下していないか)【安衛則第570条】
- ② 地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか【安衛則第570条】
- ③ ベースは敷板、敷角に正しく固定されているか【安衛則第570条】
- ④ ジャッキベース類のレベルは正しいか
- ⑤ 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか
- ⑥ ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか
- ⑦ 桁行方向に2スパン以上根がらみの無いスパンはないか
- ⑧ 敷板にジャッキベースを釘止めしない場合  
根がらみは直角2方向に取り付けられているか
- ⑨ 敷板にジャッキベースを釘止めする場合  
敷板と直角方向に根がらみが設けられているか
- ⑩ 根がらみ用布材のくさびは正しく打ち込まれているか
- ⑪ 支柱のロックピンが確実にロックされているか
- ⑫ 支柱の設置間隔は指定通りか。けた行1.85m以下、はり間1.5m以下か  
【安衛則第571条】
- ⑬ 指定通りの幅の床付き布わくが設置されているか【安衛則第563条】
- ⑭ 床付き布わくのつかみ金具の外れ止めはロックされているか
- ⑮ 床材間の隙間は3cm以下か、床材と建地の隙間は12cm以下か  
【安衛則第563条】
- ⑯ 布材等のくさびは正しく打ち込まれているか
- ⑰ 布材等の設置位置は指定通りか【安衛則第571条】
- ⑱ 先行手すりの設置位置は指定通りか
- ⑲ 先行手すりの取付部のくさびの緩みはないか
- ⑳ 先行手すりを使用していない場合、大筋かいが取り付けられているか
- ㉑ 壁つなぎは垂直水平方向とも指定通りの間隔で設置されているか  
【安衛則第570条】
- ㉒ 壁つなぎは躯体側、足場側ともに堅固な位置に正しく固定されているか  
【安衛則第570条】
- ㉓ 安全に昇降できる昇降設備は設けられているか
- ㉔ 階段手すり及び階段開口部手すりは設置されているか
- ㉕ 踊り場は2層以下毎に設置されているか
- ㉖ 梁枠を用いた開口の高さは3層以下か
- ㉗ 梁枠の外方1スパンには最下層から梁枠のレベルまで各層に先行手すりが設置されているか
- ㉘ 梁枠を支持する支柱から外方に1スパン以上設置されているか
- ㉙ 梁枠の両端支持部の支柱に壁つなぎが設けられているか
- ㉚ 梁枠間の水平面に床付き布わくを設け水平構を形成しているか
- ㉛ 転落・墜落のおそれのある場所に、手すりや安全ネット等が設置されているか
- ㉜ 支柱は垂直に組み上がっているか
- ㉝ 支柱の通りや水平は正しく出ているか
- ㉞ 著しい変形や破損のある不良部材を使用していないか
- ㉟ 部品の組み忘れはないか
- ㊱ 組立図通りに部材の配置、取り付けが行われているか
